



Általános beruházási ütemterv - II. fázis: tervezés

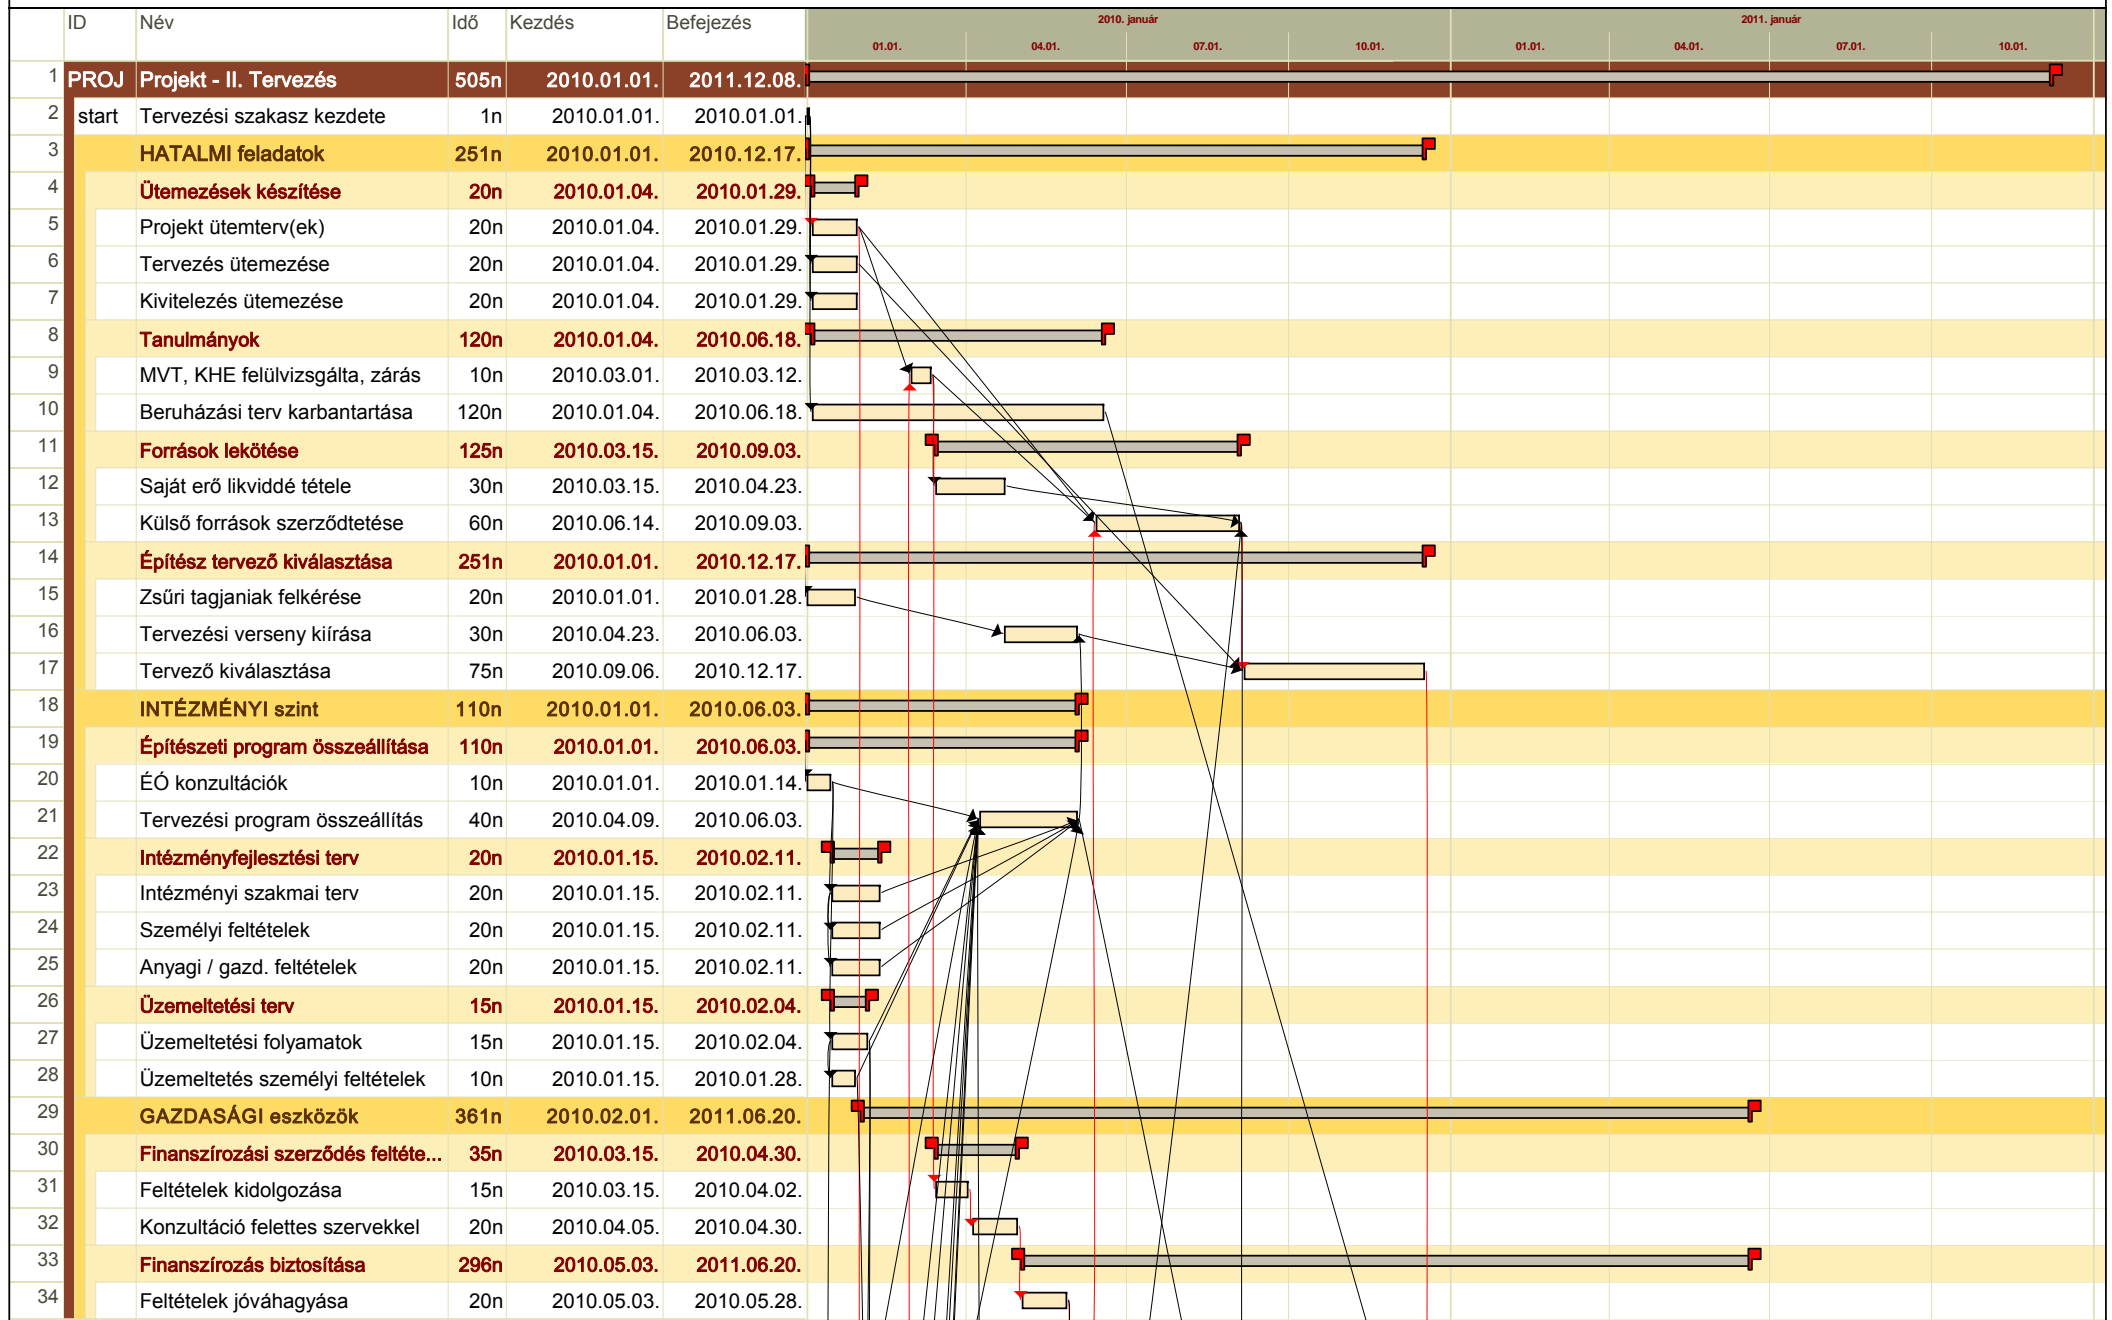

Általános beruházási ütemterv - II. fázis: tervezés

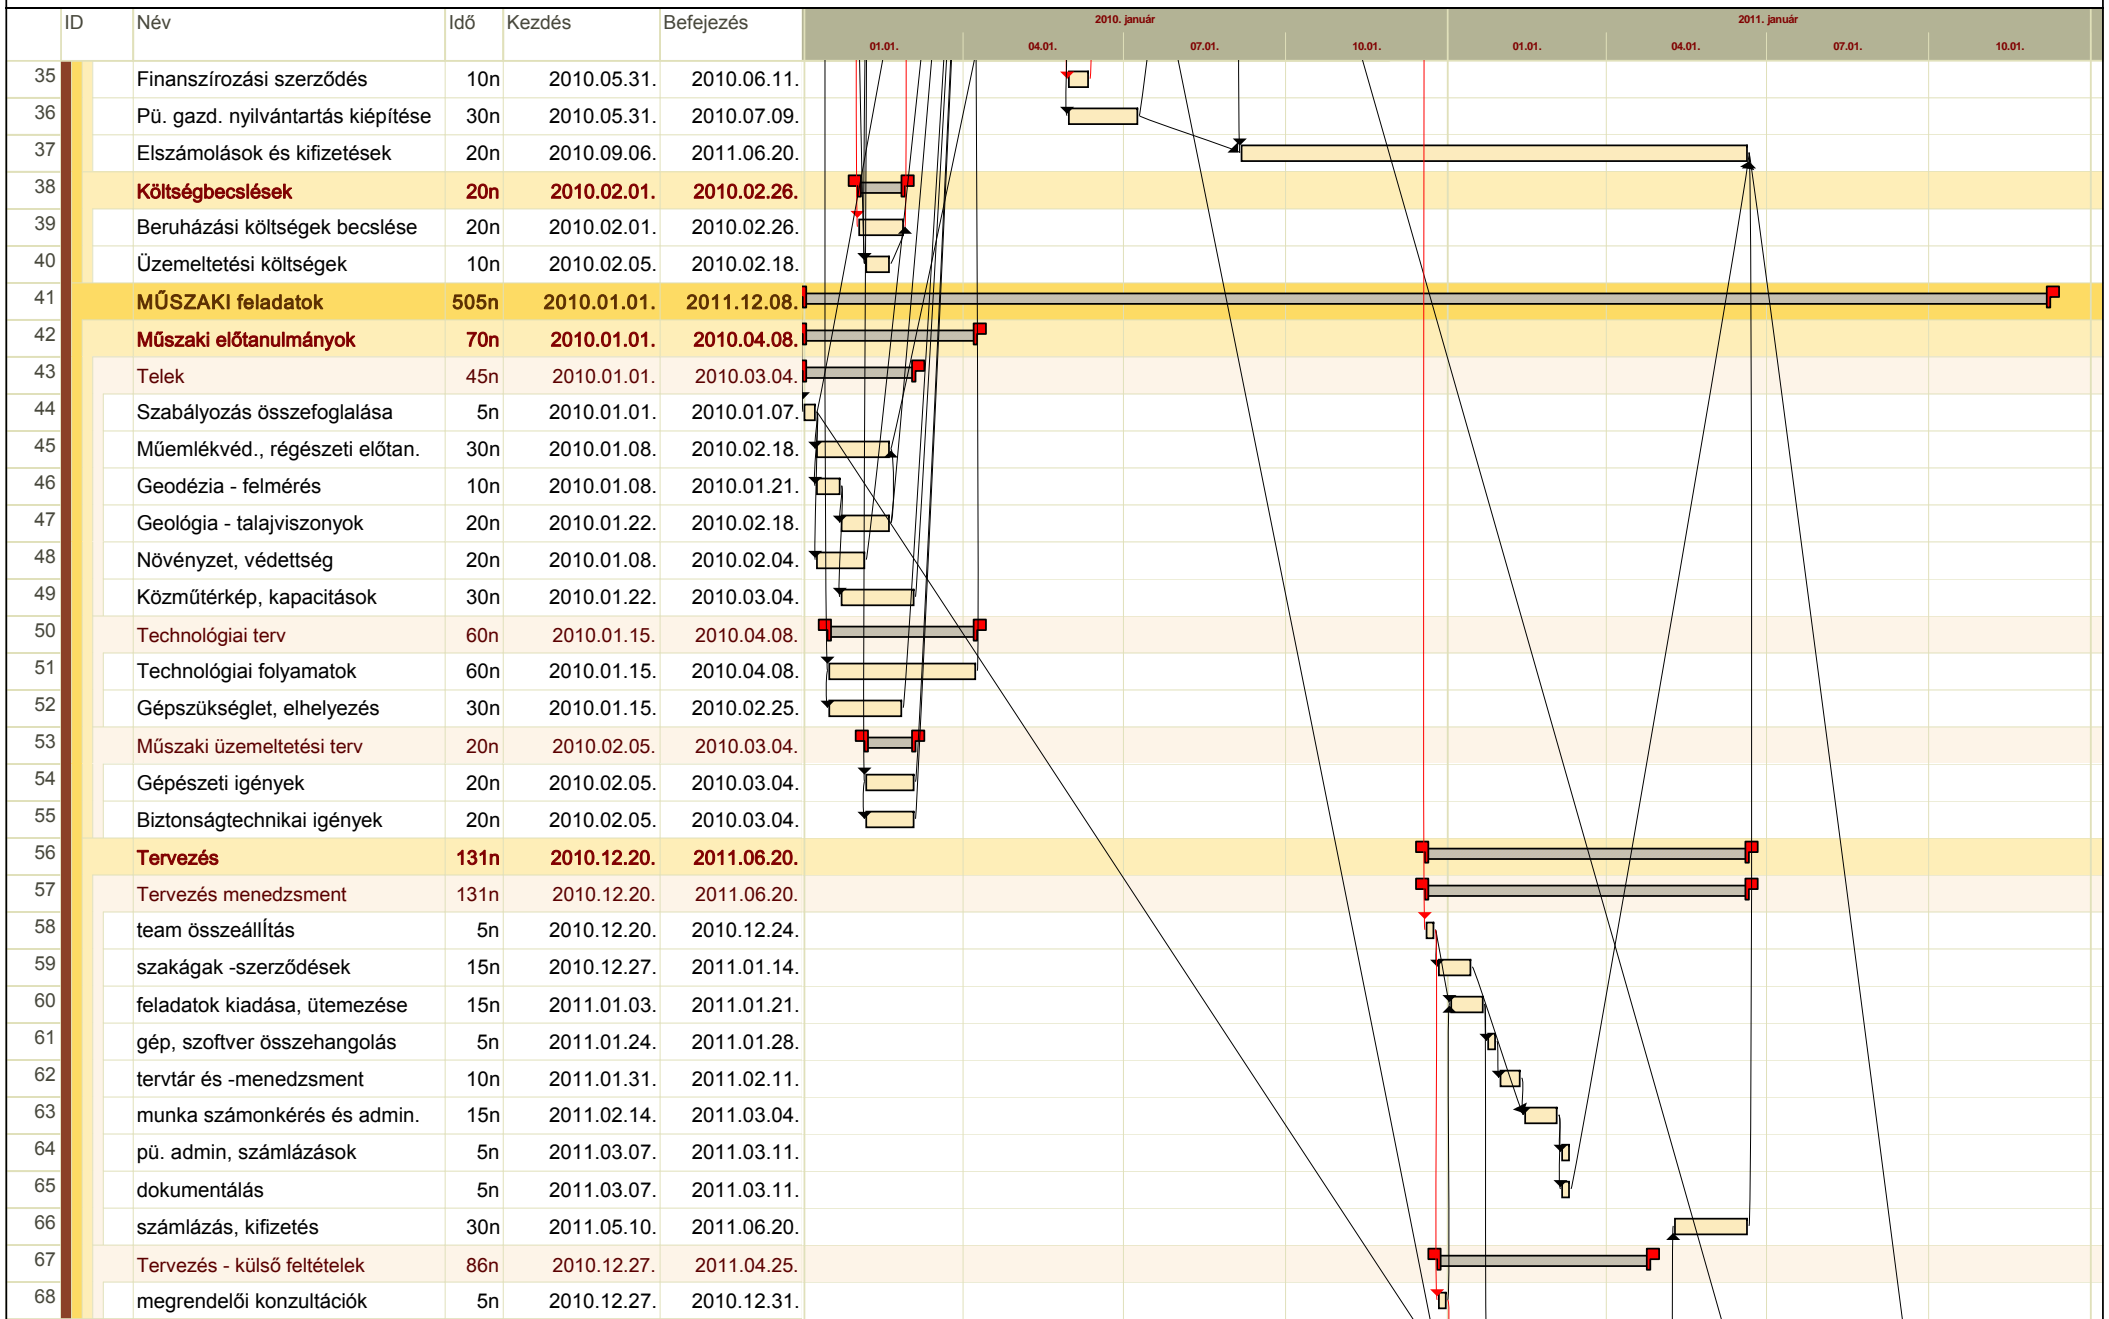

Általános beruházási ütemterv - II. fázis: tervezés

| ID | Név | Idő | Kezdés | Befejezés | 2010. január | | | | 2011. január | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | 01.01. | 04.01. | 07.01. | 10.01. | 01.01. | 04.01. | 07.01. | 10.01. | | |
| 69 | közművek és szolgáltatók | 5n | 2011.01.24. | 2011.01.28. | | | | | | | | | | |
| 70 | szakhatóság és ép.ügyi hatóság | 5n | 2011.01.03. | 2011.01.07. | | | | | | | | | | |
| 71 | tervellenőri konzultációk | 15n | 2011.04.05. | 2011.04.25. | | | | | | | | | | |
| 72 | megrendelői tervbemutatók | 3n | 2011.04.05. | 2011.04.07. | | | | | | | | | | |
| 73 | Tervezés - épülettervezés | 61n | 2011.01.10. | 2011.04.04. | | | | | | | | | | |
| 74 | program elemzés | 3n | 2011.01.10. | 2011.01.12. | | | | | | | | | | |
| 75 | beépítés, elhelyezés | 3n | 2011.01.13. | 2011.01.17. | | | | | | | | | | |
| 76 | közmű: bekötés, kiváltás | 3n | 2011.01.31. | 2011.02.02. | | | | | | | | | | |
| 77 | funkciósémák | 3n | 2011.01.13. | 2011.01.17. | | | | | | | | | | |
| 78 | alaprajz, metszet, közlekedés | 5n | 2011.01.18. | 2011.01.24. | | | | | | | | | | |
| 79 | tömeg, homlokzat | 10n | 2011.01.25. | 2011.02.07. | | | | | | | | | | |
| 80 | szerkezet: tartó, épszerk., mére... | 10n | 2011.02.08. | 2011.02.21. | | | | | | | | | | |
| 81 | gépészet: helyigény, elhelyezés | 15n | 2011.02.22. | 2011.03.14. | | | | | | | | | | |
| 82 | anyag, felület, nyílászáró | 10n | 2011.02.22. | 2011.03.07. | | | | | | | | | | |
| 83 | technológiai tervezés | 10n | 2011.03.15. | 2011.03.28. | | | | | | | | | | |
| 84 | belsőépítészeti, bútor, berendez... | 10n | 2011.03.08. | 2011.03.21. | | | | | | | | | | |
| 85 | helyiségjegyzék | 5n | 2011.03.29. | 2011.04.04. | | | | | | | | | | |
| 86 | Építési eng. megszerzése | 130n | 2011.02.22. | 2011.08.22. | | | | | | | | | | |
| 87 | Előzetes egyeztetések | 20n | 2011.02.22. | 2011.03.21. | | | | | | | | | | |
| 88 | Szakhatósági hozzájárulások | 30n | 2011.03.29. | 2011.05.09. | | | | | | | | | | |
| 89 | Beadás, elbírálás | 40n | 2011.06.07. | 2011.08.01. | | | | | | | | | | |
| 90 | Jogerőre emelkedés | 15n | 2011.08.02. | 2011.08.22. | | | | | | | | | | |
| 91 | Tenderdokumentáció | 89n | 2011.04.26. | 2011.08.26. | | | | | | | | | | |
| 92 | Tervellenőri ellenjegyzés | 5n | 2011.04.26. | 2011.05.02. | | | | | | | | | | |
| 93 | Teljesítés-igazolás | 5n | 2011.05.03. | 2011.05.09. | | | | | | | | | | |
| 94 | Dokumentáció leszállítás | 3n | 2011.08.23. | 2011.08.25. | | | | | | | | | | |
| 95 | Tenderdok. ismertetése | 1n | 2011.08.26. | 2011.08.26. | | | | | | | | | | |
| 96 | Tendereztetés | 105n | 2011.07.15. | 2011.12.08. | | | | | | | | | | |
| 97 | Kiírás | 30n | 2011.07.15. | 2011.08.25. | | | | | | | | | | |
| 98 | Tenderfolyamat | 60n | 2011.08.26. | 2011.11.17. | | | | | | | | | | |
| 99 | Eredmény, szerződés | 15n | 2011.11.18. | 2011.12.08. | | | | | | | | | | |
| 100 | End Kiviteli szakasz kezdete | 0n | 2011.12.08. | 2011.12.08. | | | | | | | | | | |
